2026年省重点民生实事“切坡建房地质灾害隐患治理”实施方案

为深入践行以人民为中心的发展思想，持续增进民生福祉，着力解决人民群众急难愁盼问题，根据省委、省政府决策部署，结合我省切坡建房地质灾害隐患实际，现就实施2026年省重点民生实事“切坡建房地质灾害隐患治理”工作，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻习近平总书记关于保障和改善民生的重要论述，落实省委、省政府以群众急难愁盼的“小窗口”“小切口”，展现服务民生“大视野”“大作为”的决策部署，坚持“人民至上、生命至上”，聚焦地质灾害风险防控，通过实施切坡建房地质灾害隐患治理，力争在2026年7月底前完成5万户切坡建房地质灾害隐患治理任务，有效消除或降低地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全，服务全省经济社会高质量发展。

二、工作任务

（一）宣传发动申报：县级自然资源主管部门组织乡镇、村及技术支撑单位，逐户开展政策宣传和实地评估。申报条件为已有切坡建房、存在地质灾害风险的住户，且未采取有效防护措施，同时预估治理费用大于6000元。乡镇负责评选确定需治理的切坡建房户，经村公示无异议后，报县级自

然资源主管部门复核，由市级自然资源主管部门审定汇总后，报省自然资源厅备案。

（二）技术方案设计：确定名单后，县级自然资源主管部门组织技术支撑单位依据“一户一策”原则，编制简易施工设计方案（见附件1），方案应包括：设计简图（标注施工具体位置、工程标准及安全注意事项），该户地理坐标，拍摄施工前现状图。

（三）施工组织管理：乡镇指导施工，可采取“户主自主施工”或“多户联合施工”模式，每户施工费用应大于6000元。省、市两级负责监督指导与随机抽查。

（四）项目验收归档：施工完成后，县级自然资源主管部门组织乡镇、村及技术支撑单位进行竣工验收，并填写竣工验收表（见附件2）；县级财政部门凭竣工验收表拨付资金至户主或施工主体账户；县级自然资源主管部门负责整理相关文件、形成总结报告，将设计方案、施工前后照片、竣工验收表、资金拨付凭证等资料归档，形成“一户一档”。

三、职责分工

（一）省级自然资源主管部门：负责项目统筹管理、补助资金保障、督导检查与绩效考核，实行周调度制度。

（二）市级自然资源主管部门：负责辖区内项目审定、汇总上报、过程监督与业务指导。

（三）县级自然资源主管部门：作为项目实施责任主体，

负责项目申报、设计、施工、验收、资金拨付及档案管理等全过程工作。

（四）乡镇人民政府：负责指导施工、技术交底、施工过程跟踪及效果监测。

（五）省地质院：所属地勘单位免费提供全程技术支撑，包括方案设计、技术指导与服务等。

四、进度安排

2026 年 1 月 20 日—3 月 15 日：宣传动员、调查摸底、项目申报、市级审定、省级备案；开展“一户一策”隐患治理方案设计，方案设计可分批完成，完成一批交付一批。

2026 年 3 月 16 日—3 月 31 日：全面组织施工，完成总任务量的 1/3 以上。

2026 年 4 月 1 日—5 月 31 日：完成全部工程施工。

2026 年 6 月 1 日—7 月 31 日：完成验收、资金拨付与资料归档。

五、工作要求

（一）加强组织协调。市、县两级政府要落实主体责任，制定政策措施，由自然资源部门牵头，各相关单位协同配合，各自发挥职能作用，加强沟通协调，形成“上下联动、部门协同、齐抓共管”的工作格局。县、乡镇人民政府评选时，要公平公正安排切坡建房户。

（二）广泛宣传动员。要主动入户做好群众工作，前期

逐户重点宣传政策内容与申报条件，中期宣传施工安全与技术要点，后期宣传治理成效与长效管护责任，营造全社会共同关注、支持、参与切坡建房地质灾害隐患治理氛围。

（三）强化技术支撑保障。技术支撑单位应组建专业团队，依据“安全适用、经济合理、便于实施”的原则科学编制方案，对户主、施工人员进行必要培训和安全交底，加强施工过程技术指导与巡查，及时解决现场技术问题。建立技术咨询响应机制，保持信息畅通，及时回应基层和群众咨询。

（四）强化资金管理。省级财政按每户 6000 元标准予以补助，确保专款专用。鼓励市县安排配套资金，统筹其他部门补助资金，制定优惠政策和鼓励措施引导住户和社会资金投入，积极探索地质灾害防治多元投入机制。

（五）健全考核机制。省直有关部门对项目执行情况进行评估考核，对进度滞后、管理不力的予以通报，并采取资金调控等措施，建立问题整改台账，细化进度要求，动态跟踪落实，确保整改到位。

附件：1.设计方案模板

2.切坡建房地质灾害隐患治理竣工验收表

附件 1　　设计方案模板

××市××县××镇××村××组陈天明等4户房屋后切坡建房地质灾害隐患治理方案图

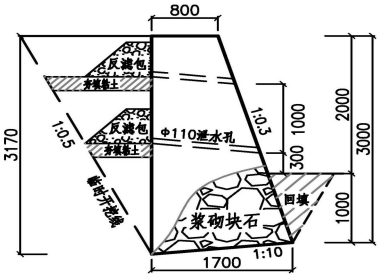

挡土墙做法示意图（单位：mm）



削方减载做法示意图

图例

切坡范围　　坡向　　挡土墙

截水沟　　排水方向

切坡建房户基本信息表

地理位置	××市××县×××镇×××村××××组		
中心坐标	113°29'25.53", 29°01'57.52"		
潜在威胁	4户22人		
户主姓名	×××	联系电话	××××××× ××××
户主姓名	×××	联系电话	××× ×××× ××××
户主姓名	×××	联系电话	××× ×××× ××××
户主姓名	×××	联系电话	××× ×××× ××××

主要工程量表

序号	分项工程名称	单位	工程数量	型号规格建议
1	挡土墙	m^3	623	墙高3m，顶宽0.8m
2	截水沟	m	100	内径宽高：40×30cm
3	削方减载	m^3	××	分×级台阶削坡，坡率1:×



截水沟做法示意图

说明：
1、本图以航飞正射影像为底图，以现场调查为基础，未开展测量、钻探等勘查工作；
2、图中工程布置为示意位置，标注工程量为估算值，最终结算以实际施工核定为准；
3、施工需结合现场实际地形、地质条件动态调整。

工程名称	××县切坡建房地质灾害隐患治理工程		
技术单位	×××		
制　图	×××	联系电话	××× ×××× ××××
日　期	2026.01	图　号	×××

附件 2

切坡建房地质灾害隐患治理
竣工验收表

<table>
<tr><td>户主姓名</td><td></td><td>地理坐标</td><td></td></tr>
<tr><td>切坡建房户地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工程实施方
（户主或委托方）</td><td></td><td>银行账号</td><td></td></tr>
<tr><td>工程概况及
工程量完成
情况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>行政村
意见</td><td colspan="3">支部书记：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>乡镇人民
政府意见</td><td colspan="3">分管乡（镇）长：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>技术支撑
单位意见</td><td colspan="3">单位：　　负责人：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>县级自然资
源主管部门
意见</td><td colspan="3">业务股室负责人：　　年　月　日</td></tr>
</table>

说明：一式四份，乡镇人民政府、技术支撑单位、县市区自然资源主管部门及财务部门各一份。
